

#### NIVEL DE ALERTA

**VERDE**  
Seguimiento rutinario


**AMARILLA**  
Atención

**NARANJA**  
Preparación

**ROJA**  
Respuesta

#### DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN PRONOSTICADA EN LA CUENCA DEL RÍO TÚA (mm/día)

Próximas 24 horas

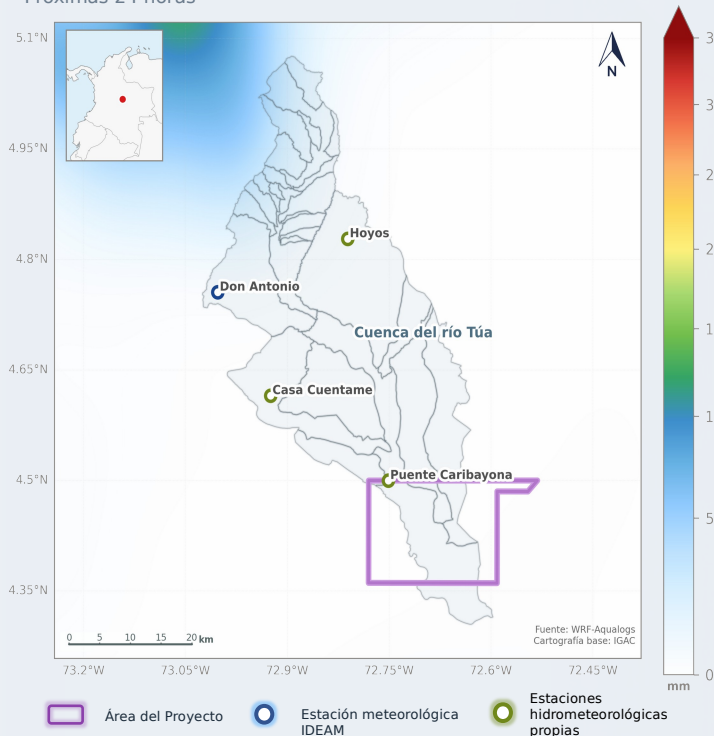

#### RESUMEN

Para el día de hoy **2026-10-13**, el Sistema SIGA emite alerta **Amarilla** para el río Túa en Puente Caribayona. La probabilidad estimada de creciente ( $\geq 2,5$  m) en los próximos 3 días es de **37 % (probable)**, y la de **creciente mayor ( $\geq 3,4$  m), 2 %**. El modelo meteorológico prevé **0.0 mm** de precipitación en las próximas 24 horas, con acumulados de **0.1 mm** y **19.7 mm** para las siguientes 48 y 72 horas, respectivamente. Se recomienda revisar el nivel del río en SIGA-Monitoreo y en la regleta, verificar equipos y comunicaciones y seguir los próximos boletines.

#### INDICADORES CLAVES DE RIESGO

##### PROBABILIDAD




##### NIVEL DE RESPUESTA



Atención

##### ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE API (10 DÍAS) (mm)




##### LLUVIA OBSERVADA (Últimas 24 h)




0.4 mm

#### EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ALERTA


Índice de alerta (0-100), últimos 7 días



#### PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN (mm/día)



#### LLUVIA OBSERVADA ESTACIONES (mm) — ÚLTIMOS 7 DÍAS



#### NIVEL DEL RÍO (m) — ÚLTIMOS 7 DÍAS



#### RECOMENDACIONES OPERATIVAS

##### SEGUIMIENTO RUTINARIO

Mantener el monitoreo rutinario del nivel del río y la lectura del boletín diario (Gestión Permanente).

##### ATENCIÓN

Revisar el nivel en SIGA en tiempo real y en la regleta, verificar equipos de bombeo y canales de comunicación, y seguir los boletines.

##### PREPARACIÓN

Activar seguimiento reforzado, alistar equipos de bombeo y recursos, confirmar personal clave e informar al Comité de Inundaciones.

##### RESPUESTA

Seguimiento continuo y Comité en alistamiento. Cierre o evacuación (Nivel 3) solo con confirmación en la regleta física.
